

Wohnanlage Remsblick, Waiblingen

Stand der Baustelle



Bauvorhaben: WA Remsblick, Waiblingen
Betrachtungszeitraum: August 2010
Bauherr: Demir Demiri

Aktueller Bautenstand:


1. Grundleitungen/ Drainage / KFT

Die Grundleitungen und Drainageleitungen unter der Bodenplatte wurden größtenteils verlegt. Ebenso wurde die KFT-Schicht unter der Bodenplatte weitgehend eingebaut.



2. Bodenplatte Keller

In den Abstellräumen 06,14,15,26, Waschküche 4 sowie im Treppenhaus 4 wurde die Bodenplatte betoniert. Weitere Abschnitte erfolgen fortlaufen in Abhängigkeit des Wetters.

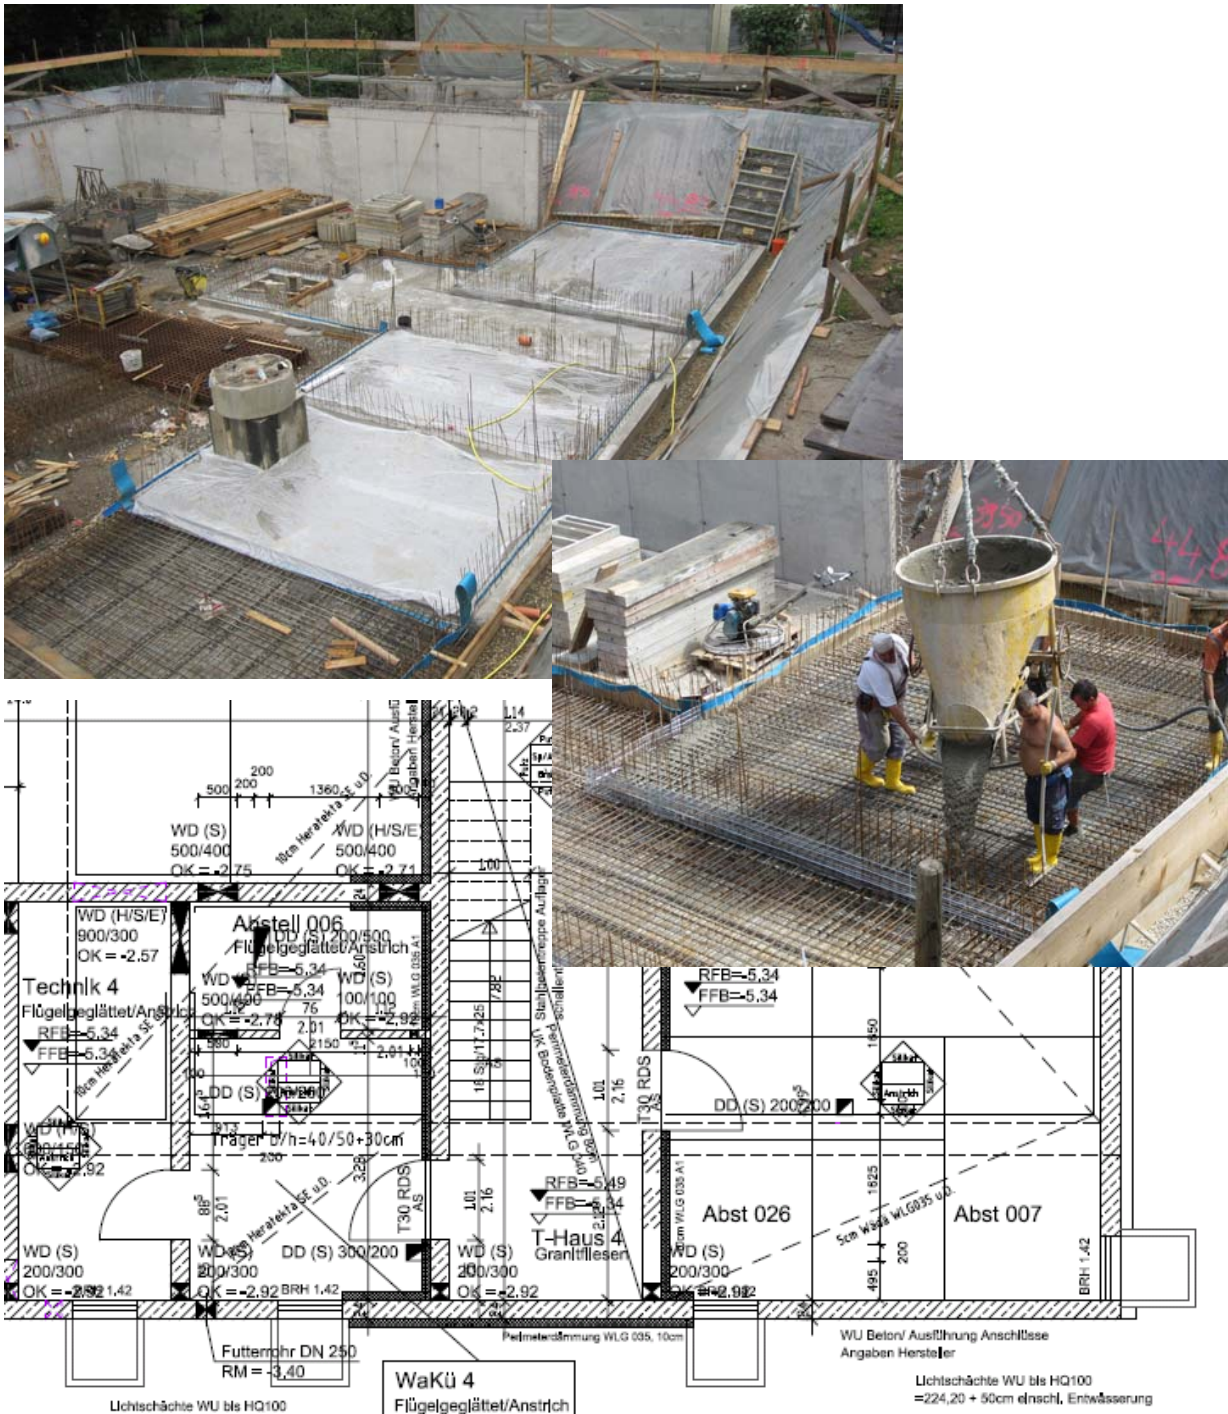

3. Wände Keller und Tiefgarage

Im nördlichen Bereich unter Haus 3 und 4 wurden die Wände (Tiefgarage) betoniert. Schritt für Schritt werden im weiteren Verlauf die Wände auf der Remsseite bewehrt, geschalt und betoniert. Die Wände System Hydraton im Kellerbereich werden sukzessive nach Fertigstellung der Bodenplatte erstellt.



Zusammenfassung:

Aktuell durchgeführte Arbeiten (Haus 1 bis 4)	Fertigstellungsgrad (ca.)
Baustelleneinrichtung	95 %
Baugrube, Böschungssicherung	100 %
Gründung – duktile Gusspfähle	100 %
Fundamentaushub	98 %
Vorbereitende Maßnahmen Fundamente	85 %
Grundleitungen und Drainage unter Bodenplatte	80 %
Bodenplatte (Bewehrung und Betonage)	25 %
Wände TG und Kellerbereich	12 %
